ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1				
2	Geodeetilised tööd	34 days	Mon 17.12.18	Thu 31.01.19
3	Projekteerimine	107 days	Fri 1.02.19	Mon 1.07.19
4	Purgla ehitus (seisab)	0 days	Wed 1.01.20	Wed 1.01.20
5	Torustiku ehitus	220 days	Tue 30.04.19	Mon 2.03.20
6	Vk-4-01 Lasteaia torustikud	40 days	Mon 2.09.19	Fri 25.10.19
7	Vk-4-01 Lasteaia taastamine	20 days	Mon 28.10.19	Fri 22.11.19
8	VK-4-02 Ranna tee torustikud	100 days	Mon 6.05.19	Fri 20.09.19
9	VK-4-02 Ranna tee taastamine	20 days	Mon 12.08.19	Fri 6.09.19
10	VK-4-03 Nooruse torustikud	20 days	Mon 30.09.19	Fri 25.10.19
11	VK-4-03 Nooruse taastamine	15 days	Mon 28.10.19	Fri 15.11.19
12	VK-4-04 Kooli torustikud	15 days	Mon 14.10.19	Fri 1.11.19
13	VK-4-04 Kooli taastamine	15 days	Mon 4.11.19	Fri 22.11.19
14	OSA 2	1 day?	Thu 3.01.19	Thu 3.01.19
15	VK-4-06 Sarapuu torustikud	70 days	Mon 3.06.19	Fri 6.09.19
16	VK-4-06 Sarapuu taastamine	20 days	Mon 9.09.19	Fri 4.10.19
17	VK-4-07 Sarapuu torustikud	100 days	Mon 3.06.19	Fri 18.10.19
18	VK-4-07 Sarapuu taastamine	20 days	Mon 21.10.19	Fri 15.11.19
19	VK-4-08 Tasuja torustikud	70 days	Mon 21.10.19	Fri 24.01.20
20	VK-4-08 Tasuja taastamine	35 days	Mon 27.01.20	Fri 13.03.20
21	VK-4-09 Metsa torustikud	15 days	Mon 7.10.19	Fri 25.10.19
22	VK-4-09 Metsa taastamised	15 days	Mon 28.10.19	Fri 15.11.19
23	VK-4-10 Kalda torustikud	35 days	Mon 16.09.19	Fri 1.11.19
24	VK-4-10 Kalda taastamised	15 days	Mon 4.11.19	Fri 22.11.19
25	VK-4-11 Orava torustikud	30 days	Mon 4.11.19	Fri 13.12.19
26	VK-4-11 Orava taastamised	20 days	Mon 16.12.19	Fri 10.01.20
27	Lõplikud katete taastused, tööde üleandmine	50 days	Mon 27.04.20	Fri 3.07.20

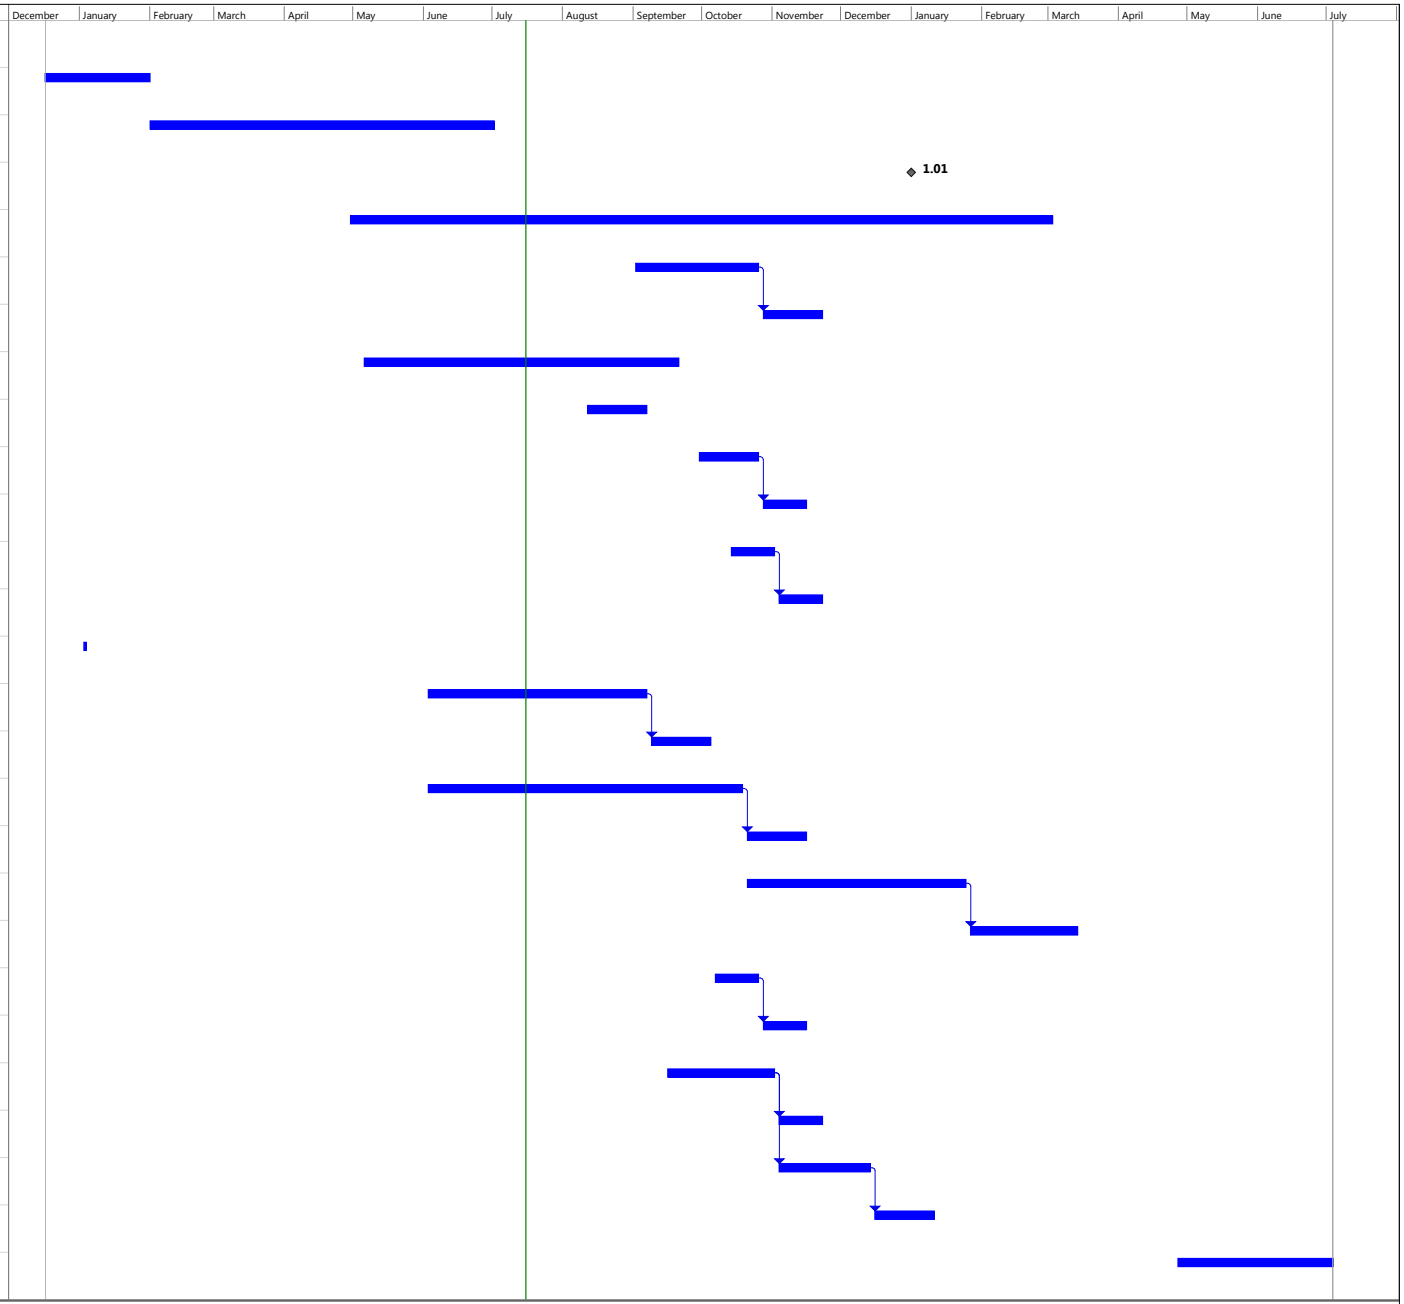

Project: Lisa 1, Tööde graafik
Date: Tue 16.07.19

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress
